

Приложение N 5  
к Положению о порядке рассмотрения  
инициативных проектов,  
выдвигаемых для получения финансовой  
поддержки из областного бюджета  
в рамках регионального  
проекта "Комфортное Поморье"

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория городского округа Архангельской области или его часть,  
в границах которой реализовывался инициативный проект:

городской округ "Город Архангельск"

2. Наименование инициативного проекта: выполнение работ  
по благоустройству прилегающей территории к многоквартирному дому по  
адресу: ул. Воскресенская д. 110.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта  
реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:  
30.07.2024 – 31.10.2024

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации  
инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен

Подрядной организацией был увеличен срок выполнения работ по причине  
поставки качественных материалов.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае  
нарушения установленного срока.

На текущую дату подрядчик завершил все необходимые работы  
по муниципальному контракту. Администрация Ломоносовского округа как  
заказчик осуществляет приемку выполненных работ совместно с инженерной  
организацией ООО «АрхСтройЗаказ», осуществляющий технический  
контроль за выполнением работ по контракту.

N п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта <*>	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу <***>
1	2	3	4
1	выполнение работ по благоустройству прилегающей территории к многоквартирному дому по адресу: ул. Воскресенская д. 110	8 554 436,77	Общество с ограниченной ответственностью "ТПК ОСНОВА"
2	оказание услуг по осуществлению технического контроля за выполнением работ по благоустройству прилегающей территории к многоквартирному дому по адресу: ул. Воскресенская д. 110	150 000 руб. 00 коп.	ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО "АрхСтройЗаказ"
3	Трудовое и имущественное участие инициаторов проекта	486 000 руб. 16 коп.	собственники помещений многоквартирного дома по адресу Воскресенская д. 110
	Итого	9 190 436,93	

<\*> В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: "имущественное участие" либо "трудовое участие".

<\*\*\*> В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.


Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	9 500,0	100	9 204,4	100
объем средств областного бюджета	8 184,4	86,2	8 184,4	88,9
объем собственных средств местного бюджета	1 315,6	13,8	520,0	5,6
объем инициативных платежей физических лиц				
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей				
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	Экономия в процессе реализации проекта			

5. Фотоматериалы <\*>:


№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта




1

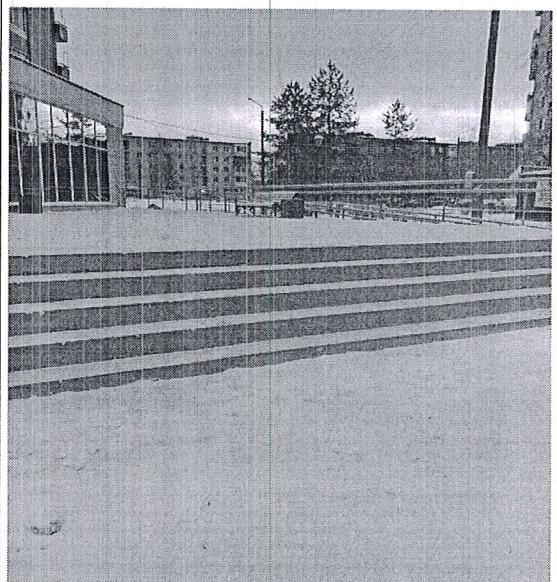

2

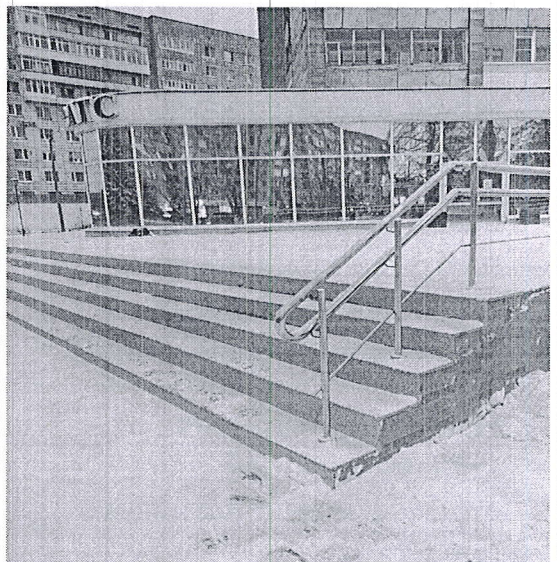

3

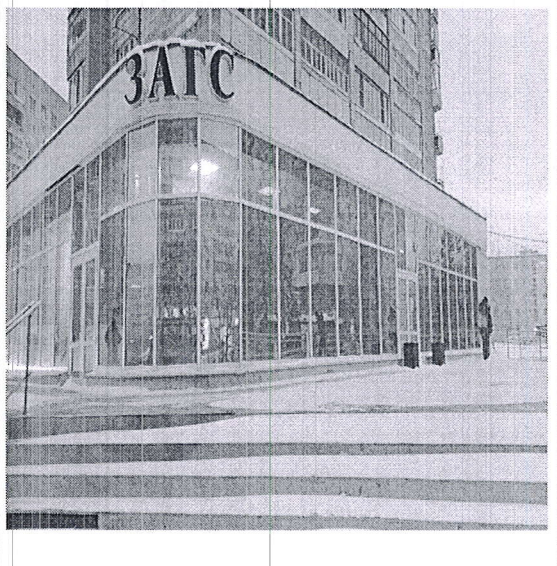



<\*> Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса".

Глава администрации округа

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'А.В. Ганущенко', written in a cursive style.

А.В. Ганущенко

Никонова Ольга Андреевна

(8182)68-23-11

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'О.А. Никонова', written in a cursive style.

